

تقرير مصور عن أعمال تأهيل محطة مياه الفيوم الجديدة

التقرير يصور وضع المحطة التشغيلي بعد عام من التوريدات والتركيبات والتشغيل لكل مراحل المحطة

يشمل التقرير على صور توضيحية لمايلي :-

➤ مبني ظلمبات المياه العكرة بالمأخذ.

➤ مبني منظومة الكلور والتعادل

➤ مبني ظلمبات حقن الشبة

➤ مبني المولد الإحتياطي

➤ المرشحات الرملية

➤ منظومة التكنر

➤ مبني ظلمبات المياه المرشحة

عنبر ظلمبات المياه العكرة

➤ تم توريد وتركيب وتشغيل عدد 6 وحدات بوادئ حركة لتشغيل الظلمبات بالمأخذ





➤ تم تركيب محابس السحب والطررد والمشغلات الكهربائية لكل طلمبات المأخذ



أعمال تأهيل مهمات عنبر الكلور

➤ تم توريد وتركيب مكونات منظومة الكلور تشمل على الاوناش وطمبات تعزيز ضغط وأجهزة حقن الكلور وكبائن حقن ومبخرات وأجهزة كشف تسرب وأجهزة تحويل آلي بين الخطوط ومنظومة تعادل وشفافات ولوحات تشغيل وخطوط الحقن داخل وخارج العنابر وعمل مايلزم من تأهيل لكامل المنظومة








أعمال عنبر الشبه

➤ تم توريد وتركيب طلبات الشبه وتغير خطوط السحب والطررد وخطوط الحقن وتأهيل المصعد وتأهيل لوحات التشغيل وتركيب مغيرات سرعة

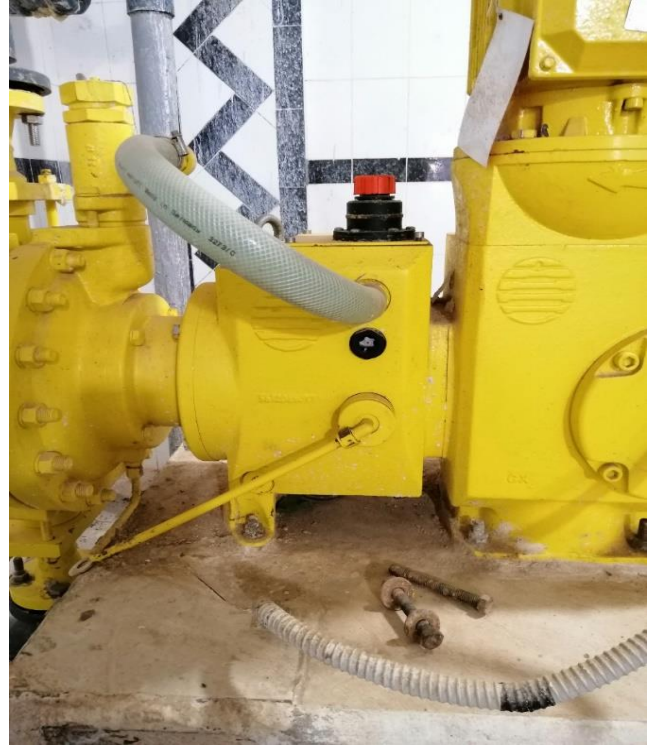

أعمال تأهيل الثكنر

➤ تم تأهيل مكونات منظومة الثكنر من ظلمبات ولوحات تشغيل وتوريد وتركيب ونش علوي



أعمال تأهيل المولد

➤ أعمال إصلاح وصيانة المولد وتغيير جهاز التحكم والتشغيل وشاحن والبطاريات وصيانة وحدة الالترنيتور والماكينة وتغيير الفلاتر والزيت وعمل تجارب والتشغيل .






المرشحات الرملية

➤ تم توريد وتركيب محابس المرشحات والمشغلات الكهربائية بجميع أنواعها وتوصيل جميع المشغلات وتشغيلها وبرمجة وضبط جميع المشغلات وتم تأهيل وصيانة وتغيير جميع مايلزم لتراييزات التشغيل وتوريد أجهزة قياس المنسوب وضبط وإصلاح جميع أجهزة الكنترول وتغيير جميع المفاتيح والريليهات والضواغط ولمبات البيان ومبيانات المنسوب والتصرف وتوريد وتركيب الكمبروسورات والمجفف وتأهيل لوحة التشغيل ولوحة ظلمبات الغسيل العكسي وصيانة وعمل مايلزم للبلورات ومنظومة الغسيل العكسي .



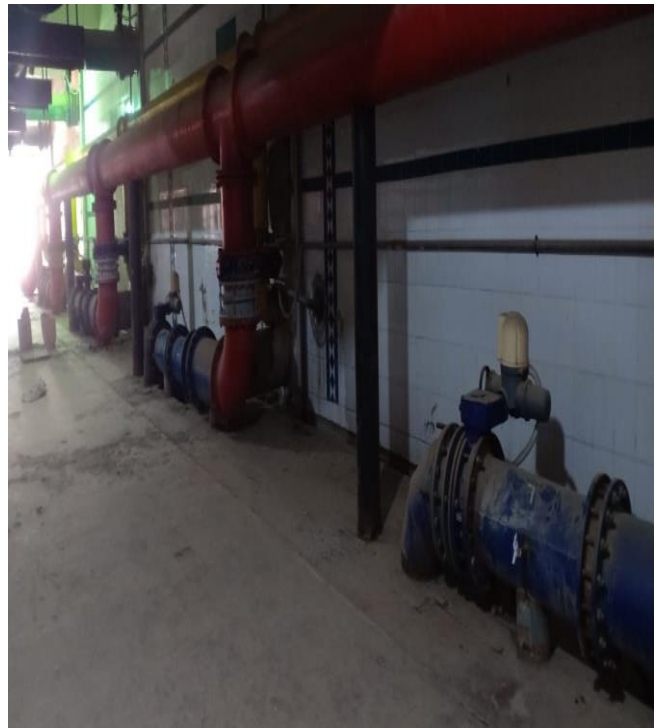

عنبر الطلمبات المرشحة

➤ تم توريد وتركيب جميع محابس السحب والطررد وصلات الفك والتركيب وتغير جميع المشغلات الكهربائية زتوصيل جميع الكابلات وضبط وبرمجة جميع المشغلات

